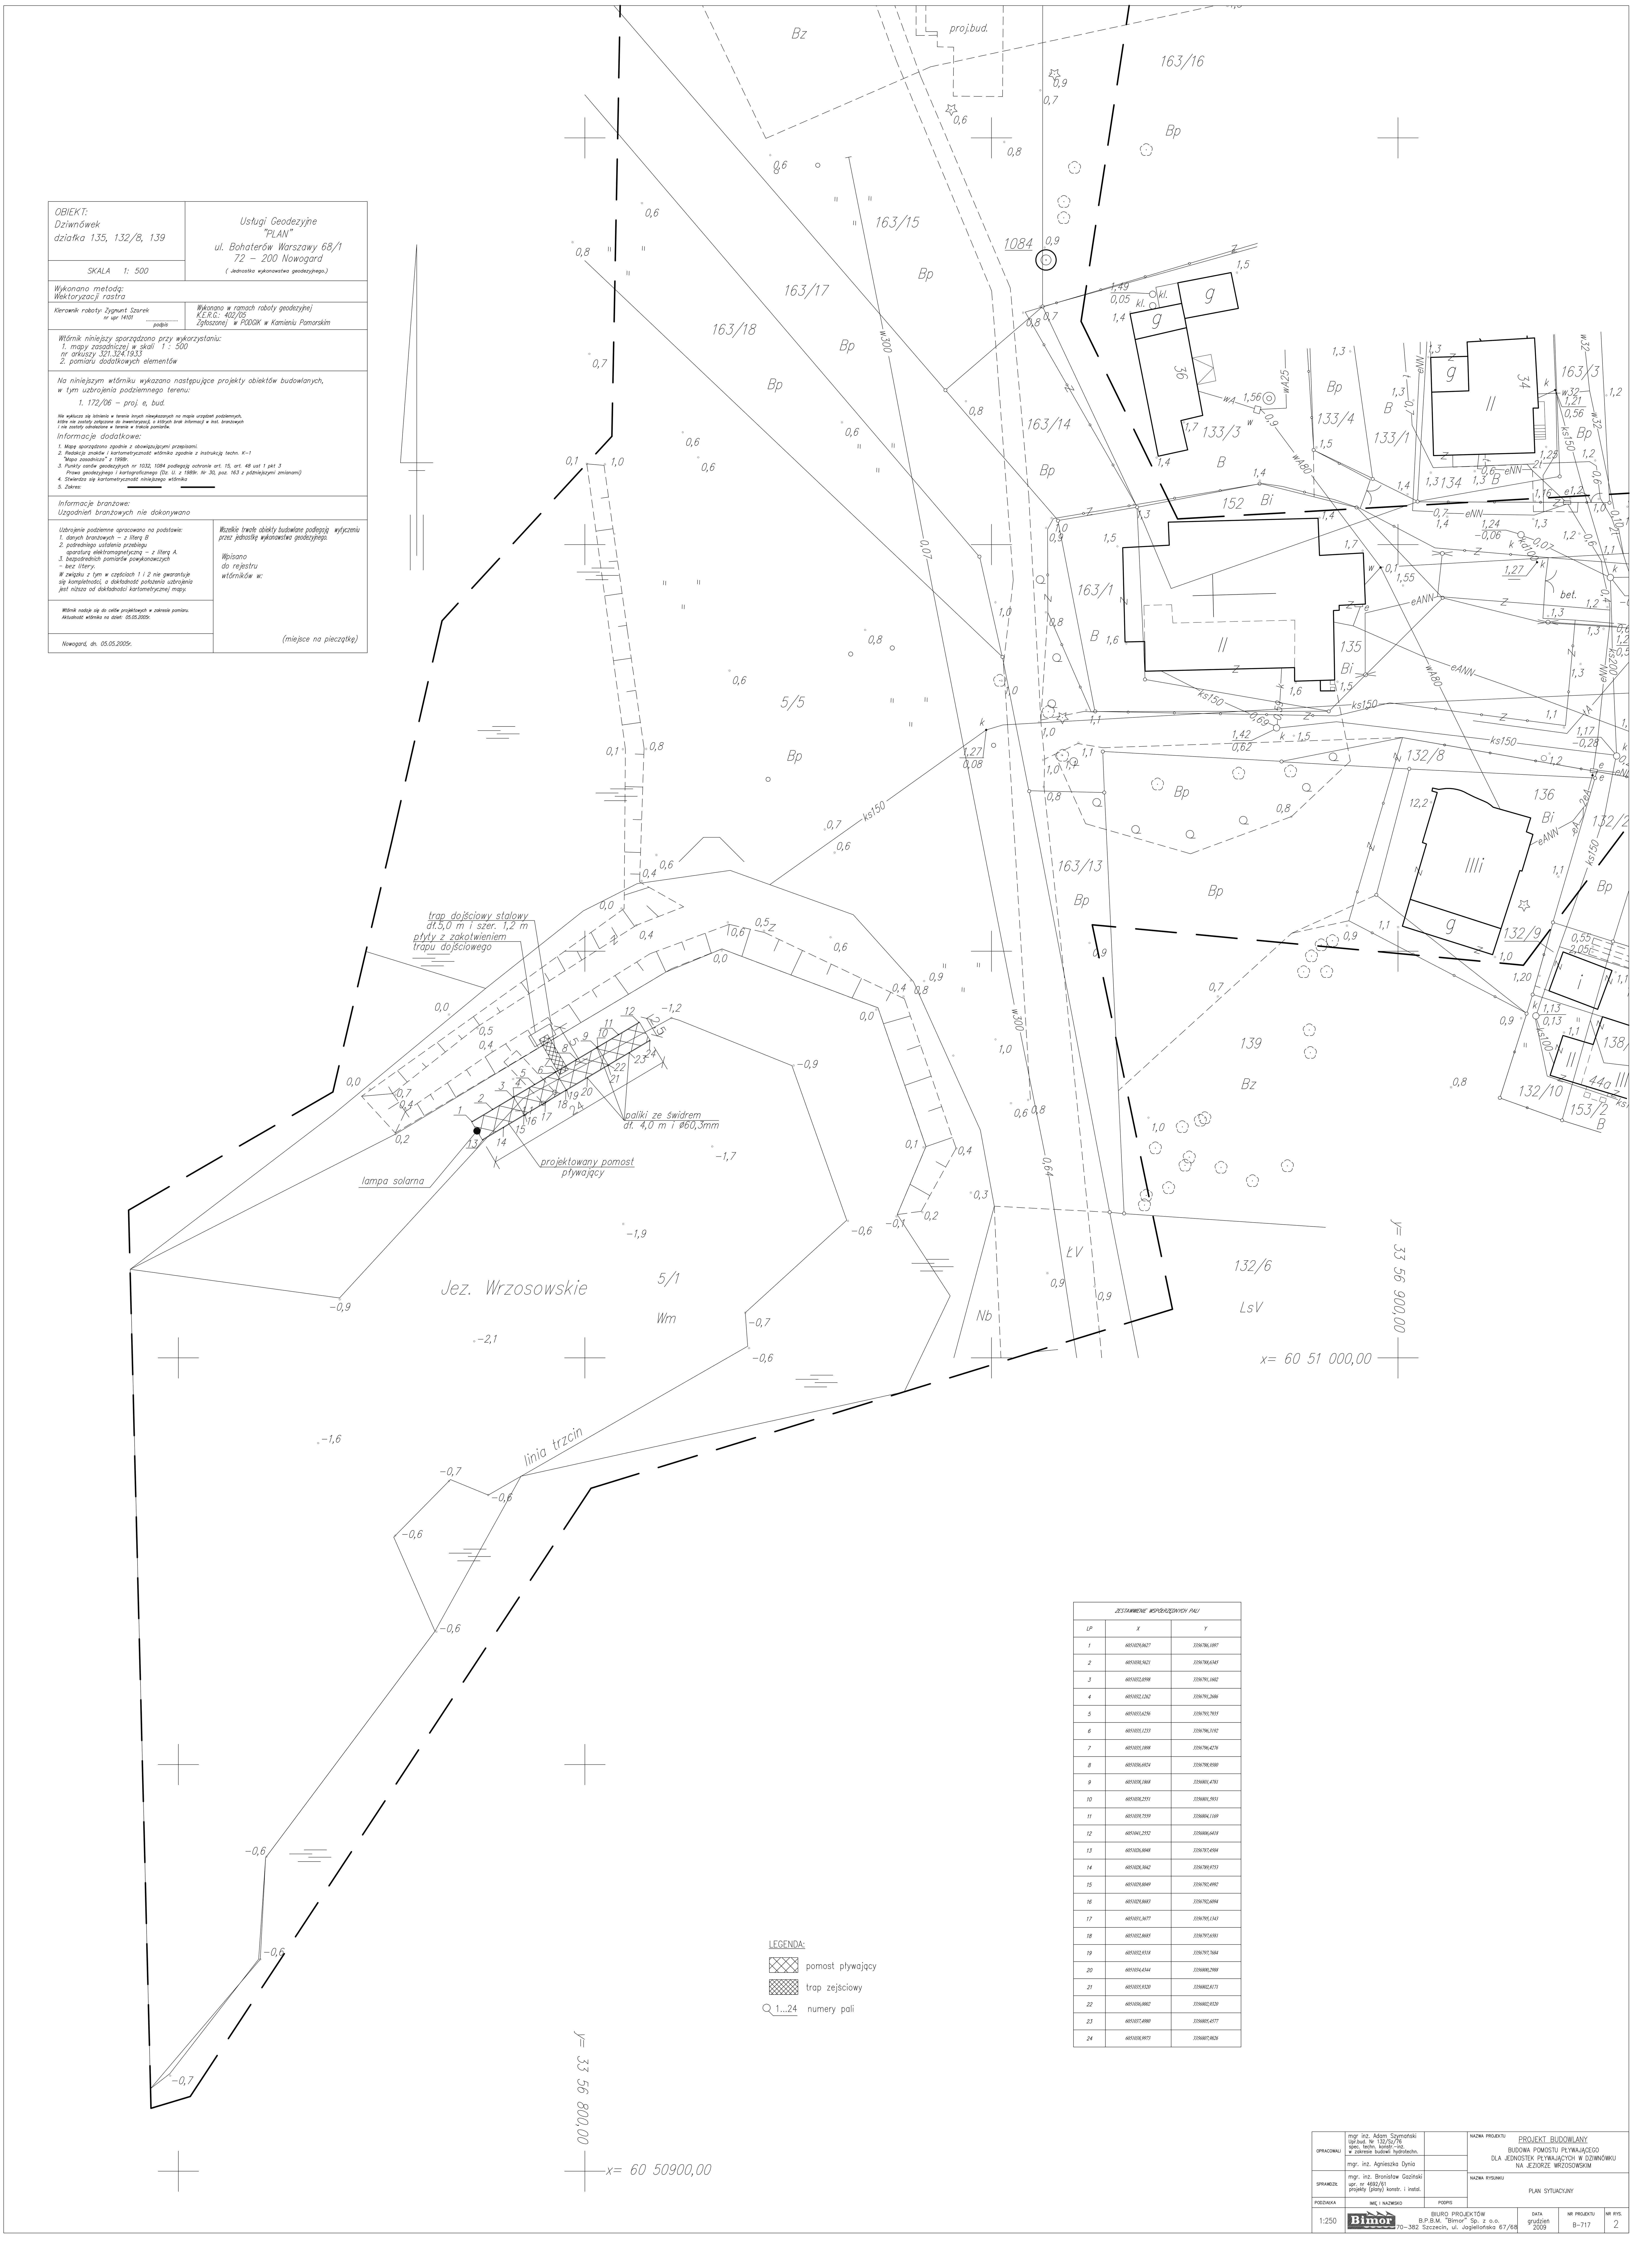


| OBIEKT: Dziwnówek działka 135, 132/8, 139 | Usługi Geodezyjne "PLAN" ul. Bohaterów Warszawy 68/1 72 – 200 Nowogard |
|---|---|
| SKALA 1: 500 | ( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.) |

Wykonano metodą:
Wektoryzacji rastra

| Kierownik robaty: Zygmunt Szarek nr upr 14101 ...................... podpis | Wykonano w ramach roboty geodezyjnej K.E.R.G.: 402/05 Zgłoszonej w PODGIK w Kamieniu Pomorskim |
|---|---|

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500
nr arkuszy 321.324.1933
2. pomiaru dodatkowych elementów

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:

1. 172/06 – proj. e, bud.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały załączone do inwentaryzacji, o których brak informacji w inst. branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w trakcie pomiarów.

Informacje dodatkowe:

1. Mapę sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Redakcja znaków i kartometryczność wtórnika zgodnie z instrukcją techn. K–1 "Mapa zasadnicza" z 1998r.
3. Punkty osnów geodezyjnych nr 1032, 1084 podlegają ochronie art. 15, art. 48 ust 1 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)
4. Stwierdza się kartometryczność niniejszego wtórnika
5. Zakres:

Informacje branżowe:
Uzgodnień branżowych nie dokonywano

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. danych branżowych – z literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A.
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Wpisano do rejestru wtórników w:

Wtórnik nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
Aktualność wtórnika na dzień: 05.05.2005r.

Nowogard, dn. 05.05.2005r.

(miejsce na pieczątkę)

ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PALI

| LP | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 6051029,0627 | 3356786,1097 |
| 2 | 6051030,5621 | 3356788,6345 |
| 3 | 6051032,0598 | 3356791,1602 |
| 4 | 6051032,1262 | 3356791,2686 |
| 5 | 6051033,6256 | 3356793,7935 |
| 6 | 6051035,1233 | 3356796,3192 |
| 7 | 6051035,1898 | 3356796,4276 |
| 8 | 6051036,6924 | 3356798,9580 |
| 9 | 6051038,1868 | 3356801,4781 |
| 10 | 6051038,2551 | 3356801,5931 |
| 11 | 6051039,7559 | 3356804,1169 |
| 12 | 6051041,2552 | 3356806,6418 |
| 13 | 6051026,8048 | 3356787,4504 |
| 14 | 6051028,3042 | 3356789,9753 |
| 15 | 6051029,8049 | 3356792,4992 |
| 16 | 6051029,8683 | 3356792,6094 |
| 17 | 6051031,3677 | 3356795,1343 |
| 18 | 6051032,8685 | 3356797,6581 |
| 19 | 6051032,9318 | 3356797,7684 |
| 20 | 6051034,4344 | 3356800,2988 |
| 21 | 6051035,9320 | 3356802,8171 |
| 22 | 6051036,0002 | 3356802,9320 |
| 23 | 6051037,4980 | 3356805,4577 |
| 24 | 6051038,9973 | 3356807,9826 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Adam Szymański Upr.bud. Nr 132/Sz/76 spec. techn. konstr.–inż. w zakresie budowli hydrotechn. | | NAZWA PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO DLA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W DZIWNÓWKU NA JEZIORZE WRZOSOWSKIM |
| | mgr. inż. Agnieszka Dynia | | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr. inż. Bronisław Gaziński upr. nr 4692/61 projekty (plany) konstr. i instal. | | NAZWA RYSUNKU | PLAN SYTUACYJNY |
| PODZIAŁKA | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | | |
| 1:250 | Bimor BIURO PROJEKTÓW B.P.B.M. "Bimor" Sp. z o.o. 70–382 Szczecin, ul. Jagiellońska 67/68 | | DATA: grudzień 2009 | NR PROJEKTU: B–717; NR RYS.: 2 |
